

Rebild Kommune

Skema til ansøgning om screening for miljøvurderingspligt

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i Miljøvurderingsloven (LBK nr 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)). Skemaet er grundlæggende fra Miljøvurderingsbekendtgørelsen (BEK nr 1376 af 21. juni 2021) kombineret med en kolonne forbeholdt sagsbehandlingen i Rebild Kommune. Det er derfor kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af Rebild Kommune.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Separatkloakeringsprojektet i Ravnkilde omfatter en omfattende opgradering af kloaksystemet for at adskille regnvand og spildevand. Dette projekt vil forbedre håndteringen af regnvand og reducere risikoen for oversvømmelser og forurening. Følgende veje vil blive berørt af projektet: •Bydamsvej •Bygaden •Sømosevej •Kløvervej •Agertoften •Skaarupvej •Skolegade •Tradsvejen Derudover vil der blive etableret et	I forbindelse med separatkloakering af kloakopladende B 2.1b og B 2.1c beliggende i Ravnkilde, ansøger Rebild Vand og Spildevand om tilladelse til etablering af et nyt regnvandsbassin med udledning til Skaarup bæk. Etablering af det nye regnvandsbassin fører flere anlægsaktiviteter med sig. Der skal lægges nye ledninger samt etableres flere bygværker. Der skal anvendes 300 m³ sand samt 300 m³ filtergrus til etablering af regnvandsbassinet. Rebild Kommune har den 04.07.2025 meddelt landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassinet. I landzonetilladelsen er terrænreguleringen ved etablering af regnvandsbassinet vurderet. I forbindelse med arbejdet er der behov for etablering af midlertidig grundvandssænkning, samt behov for dræning af området under bassinet, både i udførelsesfasen samt permanent. Den permanente dræning sker via samme dræn, som etableres i forbindelse med etablering af bassinet. Den permanente dræn er med til at sikre membranen under bassinet fra at blive ødelagt af grundvandstrykket. Arealet hvori drænen etableres er i dag allerede drænet via dræn, som leder grundvand ud i den rørlagte grøft.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
	regnvandsbassin, som skal opsamle og forsinke regnvandet. En trykledning vil blive installeret til transport af spildevand fra den sydlige del til den nordlige del af projektet. For at sikre effektiv transport af spildevandet vil der blive etableret en pumpebrønd på matrikel 5k Kirkegårde, Ravnkilde. Desuden vil der blive etableret regn- og spildevandsstik til de berørte borgere, hvilket sikrer, at både regnvand og spildevand håndteres korrekt og effektivt fra hver enkelt ejendom	Ændringen af den permanente grundvandsstand vurderes dermed at være begrænset. Der er ligeledes indsendt ansøgning vedr. den midlertidige sænkning, midlertidig udledning af grundvand, Der er søgt om indvinding og udledning af 99.120 m³ i løbet af 10 uger til primær Sømosevej i Ravnkilde. Grundvandsspejlet vil blive sænket op til 5,5 meter ved sugespidsen og drænrør i kædegravning. Det oppumpet grundvand ledes til det rørlagte vandløb Skaarup Bæk. Den nærmeste vandindvindingsboring er DGU 48.658. som er beliggende ca. 400 meter sydøst fra projektområdet. Projektområdet er beliggende indenfor et område med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsopland til almene vandværker. Derudover er der 1 km til nærmeste enkeltindvindere, som er drikkevandsboring DGU 48.1891 med beliggenhed Mejlbysvej 145, 9610 Nørager. Det oppumpet grundvand vil få en maksimal udledningsmængde på 10 l/s, hvoraf 43.200 m³ ledes til udledning og 55.920 m³ ledes til eksisterende kloak til Haverslev Renseanlæg. Der vil maksimalt blive oppumpet 2.784 m³ pr. dag, deraf 864 m³ tillades til Skaarup Bæk og det resterende ledes til eksisterende fælleskloak. Det oppumpet grundvand ledes til eksisterende udledningspunkt 10 l/s. Det oppumpet grundvand skal passere et sandfang samt iltes før udledning til Skaarup Bæk. Det private rørlagte vandløb har udløb til Skaarup Bæk 2 km nedstrøms. Bækken er god økologisk tilstand og god kemisk tilstand Anlægsarbejdet udføres på matrikel 4a, 5a, 5n, 5m, 5e, 5l samt 5k Kirkegårde, Ravnkilde. Rebild Vand og Spildevand A/S har indgået lodsejeraftaler omkring hel eller delvis erhvervelse af ovenstående matrikler. Regnvandsbassinet er dimensioneret til at kunne håndtere gentagelsesperiode på 5 år og vil få et overfladeareal på ca. 2800 m² et vådvolumen på ca. 720 m³ samt et stuvningsvolumen på ca. 1760 m³

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Regnvandsbassinet etableres med et forbassin og vil have en samlet dybde på 1,9 m. Det permanente vandspejl vil få en dybde på 1,1 m og en dybde på opstuvningsvolumenet på 0,7 m. Derudover vil der være yderligere 10 cm til overløbskoten. Bassinet vil blive udført med bentonitmembran, som sikrer at nedenstående grundvand ikke forurenes, samt at vådvolumen holdes permanent. Regnvandsbassinet udformes så det indgår som et rekreativt element i omgivelser. Det er udformet med bløde kanter, varierende vanddybder, skråningsanlæg enkelte steder på 1:10 samt variation i landskabet, samtidig med, at det oprindelige udsyn mod vest fastholdes. På arealerne omkring bassinet, udformes der et varierende landskab, med mindre bakker. Det bidrager til oplevelselementet samt biodiversiteten i området. Derudover bidrager det til, at en større del af overskudjorden kan bibeholdes på arealet, hvilket er med til at begrænse transport samt deponering af overskudsjord. Der er ansøgt om landzonetilladelse til ændring af i terrænet, som blev sendt i høring ved myndige ejere og beboere den 1.juli 2025. Der etableres serviceveje i området, således det er muligt for Rebild Vand og Spildevand A/S at drifte bygværker i tilhør til bassinet. Rebild Kommune har meddelt overkørselstilladelser til servicevejen. Udløbet fra bassinet sker via en udløbsbrønd, hvori en vandbremse sikre, at udløbestallet holdes på 10,6 l/s svarende til 2,2 l/s/red.ha. I samarbejde med Rebild Kommune er udløbstallet fastsat. Udløbstallet på 10,6 l/s sikre også, at gældende krav til udledning af miljøfremmede stoffer overholdes. Bassinet etableres med dykket udløb, således evt. oliespild ikke ledes videre ud i recipienten. Udløbet fra bassinet sker via en brønd, til et privat vandløb, som leder vandet videre til Skaarup Bæk. I forbindelse med nærværende projekt, åbnes det private rørlagte vandløb, med status af kloakteknisk anlæg, således det fremadrettet får et åbent forløb. Status på det private vandløb fastholdes på nuværende tidspunkt. Håndtering af det private vandløb, sker i tæt dialog med vandløbsmyndigheden ved Rebild Kommune.

Rebild Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		Fra bassinet etableres der et overløb, til det private vandløb. I forbindelse med overløb fra bassinet, vil overløbet ske til det kloaktekniske anlæg, som vil fyldes med vand, dernæst vil vandet strømme på terræn til de omkringliggende arealer. Udledningen til det rørlagte vandløb er kapacitetsbegrænset til ca. 150 l/s. Derved overskrides de historiske forhold ikke, hvori medbenytteraftalen har sit udgangspunkt. Projektet forventes gennemført i årene 2025-2027. Der er ligeledes ansøgt om udledningstilladelse til Skaarup Bæk samt midlertidig udledningstilladelse af oppumpet grundvand. Derudover er der søgt om accept i forhold til tidligere tilladelse til grundvandssænkning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Michael Glerup Jørgensen Rebild Vand & Spildevand A/S Østre Alle 6, Støvring 9530, Danmark 41 78 74 71 mgj@rebildforsyning.dk	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kristian Skov Lilkær Envidan A/S John F. Kennedys Plads 1E, 3. sal, 9000 Aalborg +45 46 47 31 77 ksl@envidan.dk	
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Se bilag 01	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner,	Rebild Kommune	

Rebild Kommune

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)		
hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)					
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 02				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives:	bilag 03 Målestok angives: 1:500 – Anlægget kan ikke ses/gennemskues i større målestok.			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej			
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:		
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).			Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand. j) Anlæg af vandledninger over større afstande		

Rebild Kommune

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se bilag 1	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² – 0 m ² (uændret) • Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² – 10.500 m ² (uændret) (1900m ledning i vej i 5,5m bredde. • Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ² – 800 m ² grusbefæstet adgangsvej,	Der etableres et regnvandsbassin omfattende matriklerne 4a, 5k, 5l, 5e, 5m, 5n, 5o i alt 6.973,30 m ² , 800 m ² der pt. ligger i landzone. Der skal udstedes en landzonetilladelse til etableringen. Landzonetilladelse er meddelt d. 04.07.2024
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	• Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m – 690 m • Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² – 9010 m ² (1585m ledning i vej i 3m bredde med 110 stik á 4m længde og 2m bredde. 225m ledning i mark i 3m bredde samt bassin på 2700) • Projektets bebyggede areal i m ² – Samme svar som på samme spørgsmål i pkt. 2. • Projektets nye befæstede areal i m ² – Samme svar som på samme spørgsmål i pkt. 2. • Projektets samlede bygningsmasse i m ³ – 0m ³ . Der etableres ingen bygninger. • Projektets maksimale bygningshøjde i m – 0m ³ . Der etableres ingen bygninger. • Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet – Ingen nedrivningsarbejder	Der er tidligere søgt om tilladelse til midlertidig sænkning af grundvandet i forbindelse med etablering af regn- og spildevandsledninger samt nye regnvandsbassin i Ravnkilde den 20. januar 2025. Der er efterfølgende blevet fremsendt supplerende materiale den 24. april 2025 bl.a. i forhold til grundvandssænkning. I den forbindelse er det vurderet, at det er tilstrækkeligt at udarbejde en accept af ændringerne.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer,	Periode: ca. 620 dage. Ca. 10 personer på projektet.) • Affaldstype og mængder i anlægsperioden O Restaffald O Asfalt – 563,5 m ³ (Befæstet areal: 5.635 m ² og vurderet 10cm asfalttykkelse) O Overskudsjord ved etablering af bassin 3280 m ³	Der er søgt om landzonetilladelse i forhold til ændring af terrænet samt tilladelse anlægsarbejde.

Rebild Kommune

Projektets karakteristika	Tekst	Myndighedsvurdering
hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	O Overskudsjord ved etablering af ledningsanlæg 4600 m ³ (2 m ³ pr. m) O Restaffald O Asfalt – 1050 m ³ (Befæstet areal: 10.500 m ² og vurderet 10cm asfalttykkelse) O Beton: 115 m ³ (Ca. 0,05 m ³ pr. lbm opgravet rør (Ca. 2300 m)) • Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – Uændret. Spildevand overpumpes i anlægsperioden. • Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden – Uændret. Spildevand overpumpes i anlægsperioden. • Håndtering af regnvand i anlægsperioden – Vejrafhængeligt. Håndteres med pumpning og afledning til nærtliggende grøfter/marker til nedsivning på tilsvarende vis, som regnvand i området håndteres i nuværende situation. • Anlægsperioden angivet som 2025 – 2027	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Ikke relevant	Ikke relevant
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Regnvandsbassinet oprenses efter behov iht. Vilkår i udledningstilladelsen. Spildevandet ledes til Haderslev Renseanlæg, på same vis som i dag. Regnvandet forsinkes i det kommende regnvandsbassin og renses før udledning via en vandbremsebrønd.	Det stemmer overens.

Rebild Kommune

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X		Der etableres ikke selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10	Ingen kommentar
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.	
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.	Ingen kommentar
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.	
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.	Ingen kommentar
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.	
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.	Der er ikke fastsat lokale støjgrænser for projektområdet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen	
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.	Projektet vurderes ikke at medfører luftforurening.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	

Rebild Kommune

Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.	
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	X		Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Anlægsfasen: I forbindelse med håndtering af jord, herunder opgravning samt transport, er der risiko for støvgener fra den opgravede jord. Alt efter vejret, kan der være risiko fra gener op mod 100 m væk. Transportveje vil jævnligt blive fejlet, for at begrænse eventuelle gener. Driftsfasen: Der vil ikke være støvgener i driftsfasen	Ingen bemærkninger – omfanget ligger inden for den naboretslige tålegrænse.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.	Det er vurderet at regnvandsbassinet ikke vil medfører lugtgener. Hverken i udførelses- eller driftsfasen.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Der vil i anlægsperioden ikke blive etableret belysning uden for normal arbejdstid. I driftsfasen vil der ikke være opsat belysning.	Ansøger har belyst, at der i anlægsfasen kun vil være belysning i arbejdstiden og at der ikke vil blive opsat belysning i driftsperioden.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ikke relevant

Rebild Kommune

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:	Ja, projektet omhandler etablering af et regnvandsbassin.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:	Projektet er beliggende indenfor fjernzone i en kirkebeskyttelseszone til Ravnkilde Kirke, hvilket er udlagt i kommuneplanen. Ravnkilde Kirke er beliggende centralt i landsbyen, let hævet i forhold til den omkringliggende bebyggelse. Landsbyens beliggenhed højt i landskabet, ud mod Lindenberg Å betyder, at der er uhindret udsigt til kirken på langs og på tværs af ådalen. Dog har det ikke påvirkning på projektet, da det ikke påvirker ind- og udsyn til kirken.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Der er indgået aftaler med naboarealerne.	Projektet begrænser ikke anvendelse af naboarealerne, da der er indgået aftale med arealerne, som skal anvende.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Projektområdet er ikke udlagt til råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Projektområdet er ikke placeret indenfor kystnærhedszone.
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der vil i forbindelse med projektet blive ryddet enkelte træer, men i området er der ingen sammenhængende skov, som er større end de angivne arealer.	Ingen bemærkninger I området er der enkelte træer, hvor det største sammenhængende areal udgør 0,1 ha.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Der er ikke fastlagt en kommende fredningssag.	Ingen bemærkninger
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til			160 m	Ingen bemærkninger

Rebild Kommune

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.				
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X		Der er ikke fundet bilag 2 eller bilag 4 arter i området.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			2,43 km	Det nærmeste fredet område er Gravlevdalen og Rebild bakker
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			1,04 km	Der er ligeledes en 300 m kirkebyggelinje til Ravnkilde Kirke, som er beliggende ca. 100 meter fra regnvandsbassinet, som ønskes etableret.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.	Ja projektet vil medføre en midlertidig påvirkning i form af grundvandssænkningen. Derudover vil den permanente udledning blive mindre end i dag, hvor regnvandet renses og forsinkes før udledning. Dette er beskrevet og vurderet i Udledningstilladelse for permanent udledning og midlertidig udledning fra grundvandssænkningen.

Rebild Kommune

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		 Projektområdet er beliggende i et OSD-område, dog vil regnvandet, som håndteres i projektet ikke blive nedsivet.	Projektområdet er beliggende i et OSD-område. Dog skal regnvandet ikke nedsives og regnvandsbassinet etableres med tæt bund, som beskrevet i udledningstilladelse, hvormed det vurderes ikke at være kritisk.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ravnkilde er områdeklassificeret og derudover er nærmest V2-kortlagt forurenede områder beliggende 375 m fra regnvandsbassinet på Døstrupvej 215.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X		Nærmeste risiko område er beliggende i Mejlby mere end 4 km fra projektområdet.

Rebild Kommune

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Projektområdet er ikke beliggende nær et risikoområde for oversvømmelse. De nærmeste området er Mariagerfjord og Limfjorden, som er udpeget i 2024.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		I projektet er der taget hensyn til både midlertidig grundvandssænkning, udledning, terrænregulering samt den permanente udledning af rensed regnvand. Der vurderes ikke at være andre aktiviteter, som kan have indflydelse på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Ikke relevant
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden				Ansøger har i samarbejde med Rebild Kommune tilrettet udløbstallet fra

Rebild Kommune

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst	Myndighedsvurdering
ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?				bassinet, for at sikre at udledningen af miljøfremmede stoffer ikke overskrider de statslige anbefalinger. I forbindelse med udarbejdelse af ansøgningen omkring midlertidig Grundvandssænkning er der i samarbejde med myndigheden indarbejdet krav omkring en maksimal udledning i sekundet til recipienten Ligeledes er der i projektet taget højde for, hvordan recipienten sikres ved overløb fra bassinet, ved at der er etableret en ledning, som får en droskende effekt.

Rebild Kommune

Bilag 1 Matrikelliste

Matrikelnr	Ejerlav	Adresse	Navn
1a	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 9, Ravnkilde, 9610 Nørager	Annie Marie Haslev
2ab	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 15, Ravnkilde, 9610 Nørager	Martin Rino Jørgensen
2ac	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 17, Ravnkilde, 9610 Nørager	Martin Rino Jørgensen
2ad	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 11, Ravnkilde, 9610 Nørager	Else Marie Hedegaard
2bx	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 21, Ravnkilde, 9610 Nørager	Mohammad Ibrahim Aoud
2bz	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 23, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kenneth Bargmann Beier
2cb	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 9, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jesper Lem Christiansen
2cc	Kirkegårde, Ravnkilde	Døstrupvej 215, Ravnkilde, 9610 Nørager	Annie Kjær Andersen
2cd	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 7, Ravnkilde, 9610 Nørager	TDC NET A/S
2g	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager	Carsten Meier
2t	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Karrar Al Ali
2u	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 1, Ravnkilde, 9610 Nørager	Karrar Al Ali
2x	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 13, Ravnkilde, 9610 Nørager	Aksel Halvor Jespersen
2y	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 9, Ravnkilde, 9610 Nørager	Hanne Holm
3a	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 28, Ravnkilde, 9610 Nørager	Henrik Degn
3ab	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 18, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kurt Degn
3ac	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 20, Ravnkilde, 9610 Nørager	Hans Nyboe
3ae	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 2, Ravnkilde, 9610 Nørager	Arthur Nørgaard
3af	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 15, Ravnkilde, 9610 Nørager	Erik Madsen
3ag	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 22, Ravnkilde, 9610 Nørager	Endre Gyorfi
3ah	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 40, Skårup, 9610 Nørager	Carsten Meier
3ak	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 12, Ravnkilde, 9610 Nørager	Gert Degn Nielsen
3al	Kirkegårde, Ravnkilde	Tradsvejen 7, Ravnkilde, 9610 Nørager	Brian Wall Jensen
3am	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 10, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ravnkilde Hus Byg ApS
3an	Kirkegårde, Ravnkilde	Kløvervej 1, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kirsten Sigurbjörg S Baisgaard
3ao	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	Aalborgvej 2 I/S
3ap	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 21, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ivan Uruskyi
3aq	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 19, Ravnkilde, 9610 Nørager	Alona Kornichuk
3ar	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 17, Ravnkilde, 9610 Nørager	Lars Christensen
3as	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 15, Ravnkilde, 9610 Nørager	Anne-Gitte Pedersen
3at	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 13, Ravnkilde, 9610 Nørager	Anny Kristine Østergaard Nielsen
3au	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 11, Ravnkilde, 9610 Nørager	Tommy Pedersen
3av	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 9, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ulla Krogh Jensen
3ax	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 7, Ravnkilde, 9610 Nørager	Inga Marie Thisted Sørensen
3ay	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 5, Ravnkilde, 9610 Nørager	Arne Lundgaard Kjeldsen
3az	Kirkegårde, Ravnkilde	Toften 1, Ravnkilde, 9610 Nørager	Tommy Munk Degn
3aø	Kirkegårde, Ravnkilde	Kløvervej 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Niklas Lyngse Sørensen
3ba	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 2, Ravnkilde, 9610 Nørager	Bjørn Haulund Hansen
3bb	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 4, Ravnkilde, 9610 Nørager	Sonja Værum
3bc	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 6, Ravnkilde, 9610 Nørager	Karen Bjørn
3bd	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	Helle Ditlev Nielsen

Rebild Kommune


3be	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 10, Ravnkilde, 9610 Nørager	Søren Gärtner Wulff
3bf	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 12, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ole Langgaard
3bg	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 14, Ravnkilde, 9610 Nørager	Michael Farsø Gärtner
3bh	Kirkegårde, Ravnkilde	Toften 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Steen Møller Jensen
3bi	Kirkegårde, Ravnkilde	Toften 2, Ravnkilde, 9610 Nørager	N Jørgen Kragbæk Kristensen
3bk	Kirkegårde, Ravnkilde	Agertoften 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Martin Hammer
3bl	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 2A, Ravnkilde, 9610 Nørager	BOLIGSELSKABET NORDJYLLAND
3bn	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 6, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jens Jørn Andersen
3bo	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømoosevej 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	Nematollah Amini
3br	Kirkegårde, Ravnkilde	Tradsvejen 12, Ravnkilde, 9610 Nørager	John Tulstrup Petersen
3d	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 4, Ravnkilde, 9610 Nørager	Rebild Kommune
3i	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 19, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ravnkilde Forsamlingshus
3k	Kirkegårde, Ravnkilde		Ravnkilde Forsamlingshus
3q	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 25, Ravnkilde, 9610 Nørager	Carina Kirch Rasmussen
3s	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 6, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ole Bargmann Christensen
3t	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 4, Ravnkilde, 9610 Nørager	Hanne Holm
3u	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 23, Ravnkilde, 9610 Nørager	Malene Høj Olesen
3v	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	Henriette Kielgast Ovesen
3x	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 10, Ravnkilde, 9610 Nørager	POWER WORKERS ApS
3z	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 16, Ravnkilde, 9610 Nørager	POWER WORKERS ApS
3æ	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 21, Ravnkilde, 9610 Nørager	Tenna Hejlesen Nørgaard
3aa	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 2, Ravnkilde, 9610 Nørager	Brorstrup-Ravnkilde Kirkegård/ Menighedsrådet
4a	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 31, Ravnkilde, 9610 Nørager	Helle Randers
4ab	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 20, Ravnkilde, 9610 Nørager	Harly Schmidt Andersen
4ac	Kirkegårde, Ravnkilde		Niels Peter Koustrup Christensen
4af	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 9, Ravnkilde, 9610 Nørager	Chris Kjær Andersen
4ag	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 13, Ravnkilde, 9610 Nørager	Tobias Buus
4ah	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 5, Ravnkilde, 9610 Nørager	Nicolai Drastrup Nielsen
4ai	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 11, Ravnkilde, 9610 Nørager	Morten Hansen
4ak	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 22, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jens Lund Nielsen
4al	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 1A, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ravnkilde Børneunivers
4am	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT
4an	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 10, Ravnkilde, 9610 Nørager	Per Skovgaard Rasmussen
4ao	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 2, Ravnkilde, 9610 Nørager	Karl Alfred Petersen
4ar	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Rebild Kommune
4as	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 4A, Ravnkilde, 9610 Nørager	AAGE SØRENSEN AUTOMOBILER A/S - INTERNATIONAL TRANSPORT
4au	Kirkegårde, Ravnkilde	Sortebakken 8, 9610 Nørager	REBILD VAND & SPILDEVAND A/S
4av	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 8, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jens Lindberg Møller
4ay	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 15, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kjeldsen Ejendomme ApS
4aæ	Kirkegårde, Ravnkilde	Skolegade 1B, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ravnkilde Vandværk A.m.b.a.
4aø	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 29, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kasper Brunskov Mathiesen
4bb	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 7, Ravnkilde, 9610 Nørager	Kaj Degn

Rebild Kommune

4bc	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 17, Ravnkilde, 9610 Nørager	Dennis Køng Jakobsen
4i	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 14, Ravnkilde, 9610 Nørager	Rebild Kommune
4k	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 2, 9610 Nørager	Louise Olesen
4l	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 1, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jens Lindholt Henriksen
4m	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 5, Ravnkilde, 9610 Nørager	Krista Ritter Kallestrup
4n	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 1, Ravnkilde, 9610 Nørager	Zennia Leonora Heindorf Olsen
4o	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 16, Ravnkilde, 9610 Nørager	Morten Lem
4p	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 6, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jes Harreby Sonnichsen
4q	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 4, Ravnkilde, 9610 Nørager	Rita Raara Falck-Petersen
4r	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Jacob Lundsgaard
4s	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 5, Ravnkilde, 9610 Nørager	Allan Sørensen
4t	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 3, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ardy Graversen Jensen
4u	Kirkegårde, Ravnkilde	Skaarupvej 7, Ravnkilde, 9610 Nørager	Niels Peter Koustrup Christensen
4v	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 18, Ravnkilde, 9610 Nørager	Sanne Varshøj
4x	Kirkegårde, Ravnkilde	Bygaden 16, Ravnkilde, 9610 Nørager	Morten Lem
5a	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømsevej 19, Ravnkilde, 9610 Nørager	Carsten Meier
5d	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømsevej 25, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ravnkilde Borgerforening
5e	Kirkegårde, Ravnkilde		Carsten Meier
5f	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 14, Ravnkilde, 9610 Nørager	Inger Lebech Kaagaard
5g	Kirkegårde, Ravnkilde	Bydamsvej 14, Ravnkilde, 9610 Nørager	Inger Lebech Kaagaard
5h	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømsevej 18, Ravnkilde, 9610 Nørager	Ib Jørgensen
5i	Kirkegårde, Ravnkilde	Sømsevej 20, Ravnkilde, 9610 Nørager	RENATI ApS
5k	Kirkegårde, Ravnkilde		Ib Jørgensen
5l	Kirkegårde, Ravnkilde		Carsten Meier
5m	Kirkegårde, Ravnkilde		Carsten Meier
5n	Kirkegårde, Ravnkilde		Carsten Meier
5o	Kirkegårde, Ravnkilde		Carsten Meier
7000k	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000a	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000h	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000n	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000d	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000c	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000i	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	
7000b	Kirkegårde, Ravnkilde	Offentlig vej	

Rebild Kommune

Bilag 02

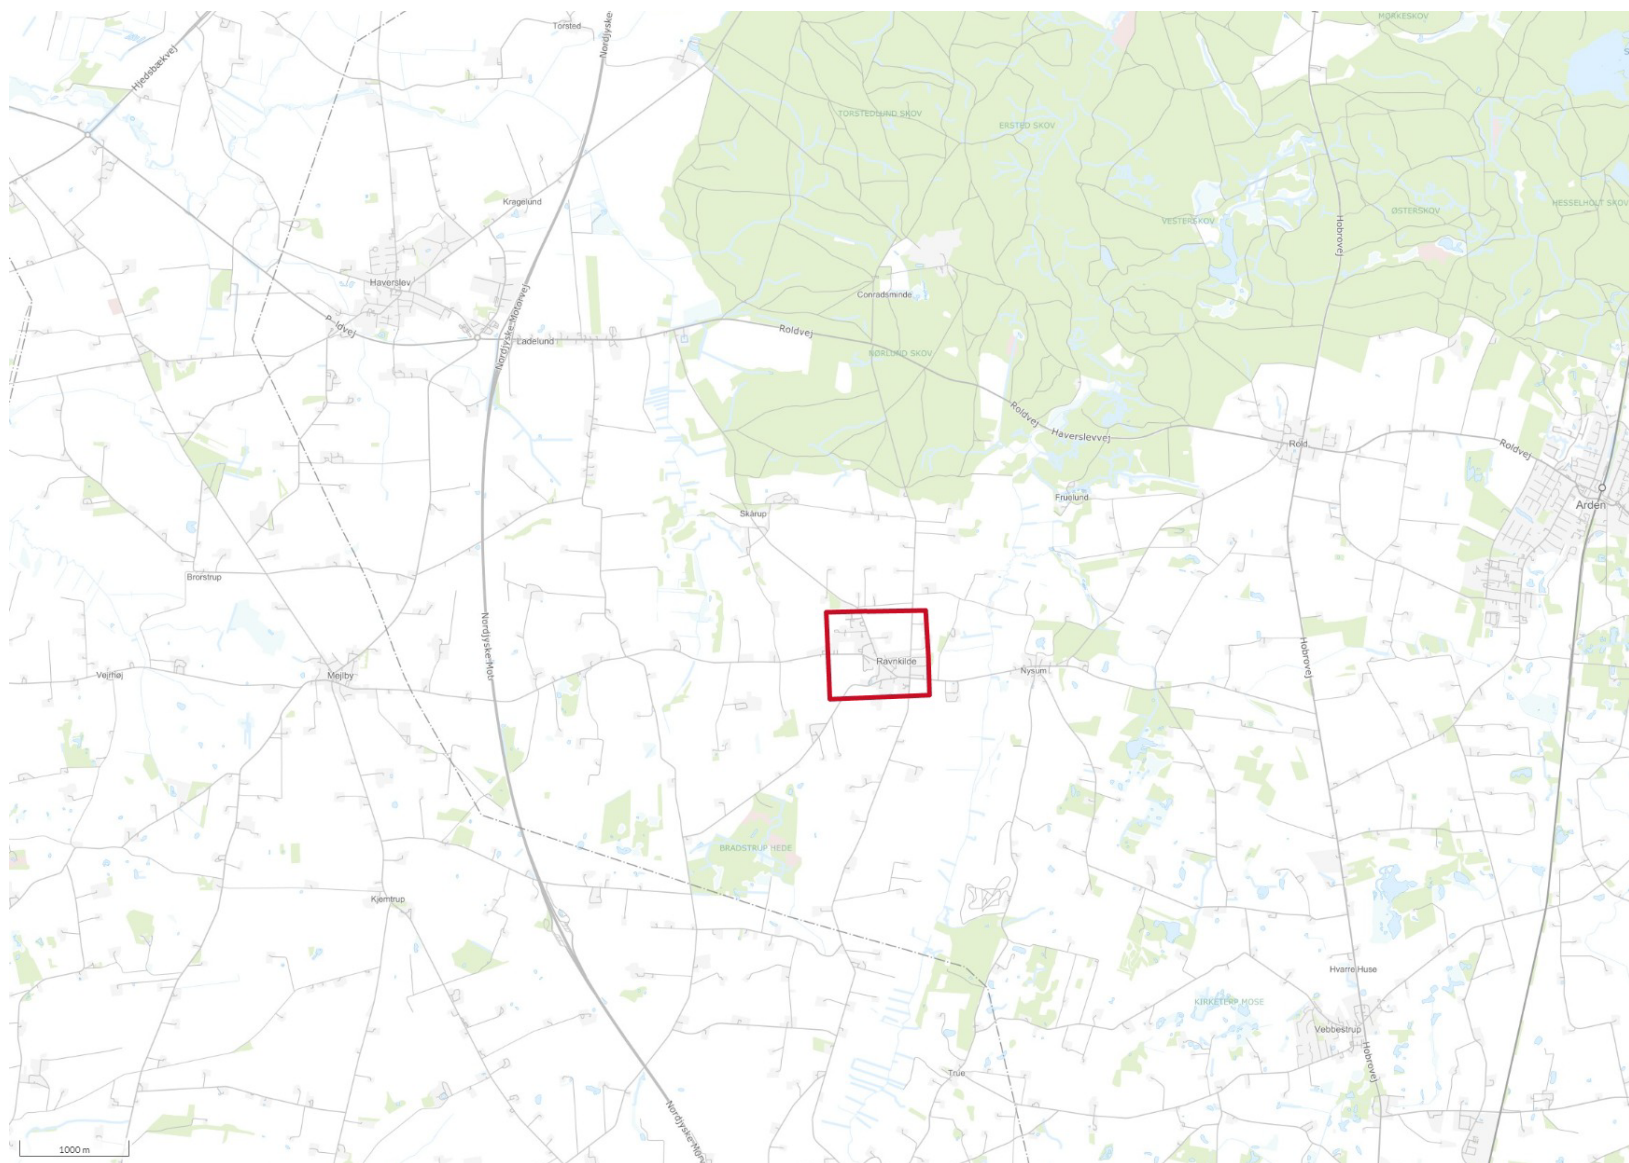

Rebild Kommune

Bilag 03





Myndighedsscreening				
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X	
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			x	
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			x	
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			x	
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			x	
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			x	
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			x	
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			x	
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			x	Dette er taget hånd om i udledningstilladelsen i forhold til udledningsmængde og miljøfremmede stoffer.
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder Nationalt: Internationalt (Natura 2000):			x	
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			x	
Forventes området at rumme danske rødlistearter			x	

Rebild Kommune

Myndighedsscreening					
	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			x		Dette er taget hånd om i udledningstilladelsen samt tilladelse til grundvandssænkning.
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			x		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			x		
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			x		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)			x		
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter			x		
Miljøpåvirkningsgrad og - kompleksitet			x		
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					

Myndighedens konklusion			
	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der er krav om miljøvurdering:		x	Igennem udledningstilladelse, landzonetilladelse, tilladelse til grundvandssænkning, tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand.

Rebild Kommune

Dato: 11-07-2025 Sagsbehandler: Maria Simonsen Center for Miljø og Teknik, Rebild Kommune
