Produktionstidsplan
Udarbejdet SW
16. maj. 2013

Færch & Co

Id	Opgavetil	Opgavenavn	Varighed	Startdato	Slutdato
1					
2		**Kontrakt**	**15 dage**	**ma 29-04-13**	**fr 17-05-13**
5		**Projekterings fasen**	**20 dage**	**ma 20-05-13**	**fr 14-06-13**
9		**Hovedprojektering**	**50 dage**	**ma 17-06-13**	**fr 13-09-13**
14		**Byggeperiode**	**219 dage?**	**ti 21-05-13**	**fr 11-04-14**
15		Moblisering af byggeplads	9 dage	ti 21-05-13	fr 31-05-13
16		Nedbrydning	36 dage	ma 27-05-13	fr 02-08-13
17		Jordarbejde bygning	25 dage	ma 01-07-13	fr 23-08-13
18		Fundamenter	40 dage	ma 29-07-13	to 26-09-13
19		Betonelementer	45 dage	ma 02-09-13	fr 01-11-13
20		Tagelementer og ovenlys	25 dage	ma 30-09-13	fr 01-11-13
21		Tagisolering	30 dage	ma 14-10-13	fr 22-11-13
22		Vinduesmontage	30 dage	ma 16-09-13	fr 25-10-13
23		Glas alupartier	25 dage	ma 21-10-13	fr 22-11-13
24		Flydegulv i fløjene	30 dage	ma 30-09-13	fr 08-11-13
25		Solafskærmning	40 dage	ma 14-10-13	fr 06-12-13
26		**Komplementering**	**125 dage?**	**ma 30-09-13**	**fr 21-03-14**
27		komplementerin			
28		gipsvægge	50 dage	ma 30-09-13	fr 06-12-13
29		Malerarbejde	120 dage	ma 07-10-13	fr 21-03-14
30		Lofter	50 dage	ma 25-11-13	fr 31-01-14
31		Glasvægge og indvendige dør	40 dage	ma 06-01-14	fr 28-02-14
32		gulve	35 dage	ma 03-02-14	fr 21-03-14
33		Montage storkøkken	20 dage	ma 03-02-14	fr 28-02-14
34		installationer	135 dage	ma 16-09-13	fr 21-03-14
35		Mangelgennemgan	11 dage	fr 21-03-14	fr 04-04-14
36		Aflevering		fr 11-04-14	

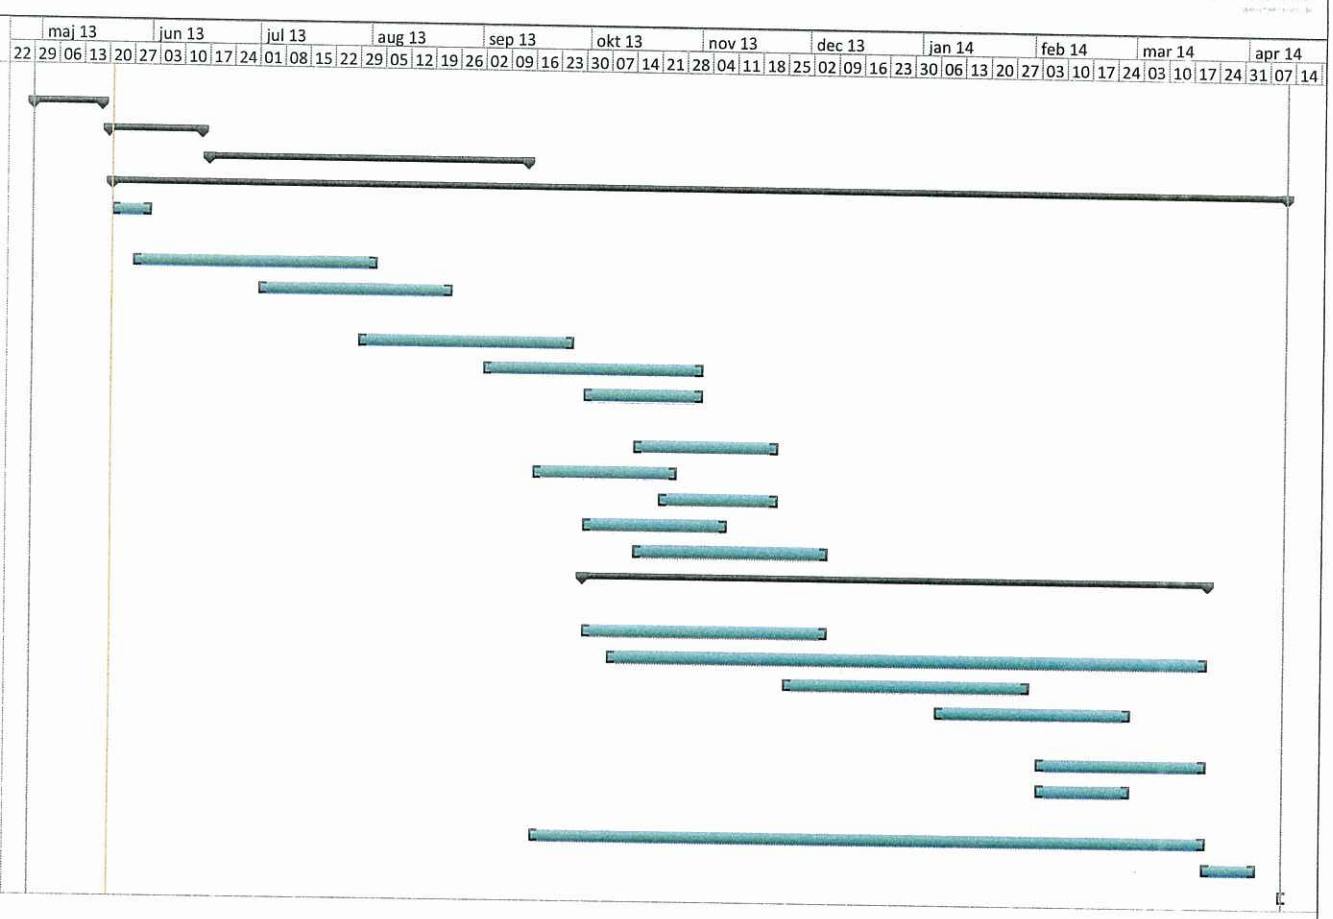

Projekt: Projekterings og produkt
Dato: ti 21-05-13

Opgave | Milepæl | Projektoversigt | kun start
Opdeling | Hovedopgave | Manuel opgave | Kun slutdato
